

暇都下第343号
令和元年6月7日

国土交通大臣 様

四條暇市長 東 修



社会資本総合整備計画の事後評価の報告について

社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項に基づき、社会資本総合整備計画の事後評価を行ったので、別添のとおり報告する。

記

社会資本総合整備計画名称：四條暇市公共下水道整備計画

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年5月7日


計画の名称	四條畷市公共下水道整備計画							重点配分対象の該当									
計画の期間	平成27年度～平成29年度(3年間)			交付対象	四條畷市												
計画の目標	田原処理区の流域編入に伴う接続管渠の整備を行うことにより、効率的な下水道事業を実現する。																
計画の成果目標(定量的指標)	田原処理区の流域編入に伴う接続汚水管渠の整備(全延長5.5km) 汚水管渠整備率を52.2%(H27当初)から62.0%(H28)に増加																
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考										
				当初現況値	中間目標値	最終目標値											
				(H27当初)	(H28末)	(H29末)											
① 田原処理区汚水管渠整備率(%)	= 整備完了済み延長(KM) / 整備を実施すべき延長(KM)			52.20%	62.00%	62.00%											
	= 2.87KM(H27当初) / 5.5KM					63.82%											
全体事業費	合計(A+B+C+D)	130.4百万円	A	130.4百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0%					
		130.4百万円		130.4百万円		0百万円		0百万円		0百万円		0%					
事後評価																	
○事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制				事後評価の実施時期													
四條畷市社会資本総合整備計画の事業に係る事後評価実施要綱に基づき評価を実施。				令和元年5月													
				公表の方法													
				四條畷市ホームページにて公表する。													
交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
A1-1	下水道	一般	四條畷市	直接	-	田原処理区 処理場間ネットワーク管渠及び実施設計	φ250 L=610m	四條畷市						126.4	-	未策定	
														126.4			
A1-2	下水道	一般	四條畷市	直接	-	田原処理区施設計画策定	186.37ha	四條畷市						2.0	-	未策定	
														2.0			
A1-3	下水道	一般	四條畷市	直接	-	鴻池処理区施設計画策定	488ha	四條畷市						2.0	-	未策定	
														2.0			
合計													130.4				
合計													130.4				
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計													0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容(延長・面積等)	市町村名(港湾・地区名)	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計													0.0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	備考
									H27	H28	H29	H30	H31			
									合計					0.0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況														
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 田原処理区 処理場間ネットワーク管渠を整備したことで流域下水道への編入事業が進展した。また、同ネットワーク管渠及びポンプ場化工事の実施設計を行ったことで次期計画において残区間の事業実施が可能となった。 												
II 定量的指標の達成状況		指標①(田原処理区汚水管渠整備率の割合)	最終目標値	62.00%	目標値と実績値 に差が出た要因	次期予定箇所を前倒して施工した結果、計画延長610mに対し、634.1mの実績となったので増となった。								
			最終実績値	63.82%										
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)														
3. 特記事項(今後の方針等)														
<p>田原処理区 処理場間ネットワーク管渠及び実施設計については、平成29年度より重点計画に切出し、四條畷市公共下水道整備計画(重点計画)として平成29年度より5ヶ年の新規計画を策定した。また、処理場のポンプ場化工事の内、耐震化及び設備更新については四條畷市公共下水道整備計画(その2)として平成31年度より3ヶ年の新規計画を策定した。この2つの計画を実施することにより、田原処理区の流域編入を行うことができる。</p>														

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	四條畷市公共下水道整備計画		
計画の期間	平成27年度～平成29年度(3年間)	交付対象	四條畷市

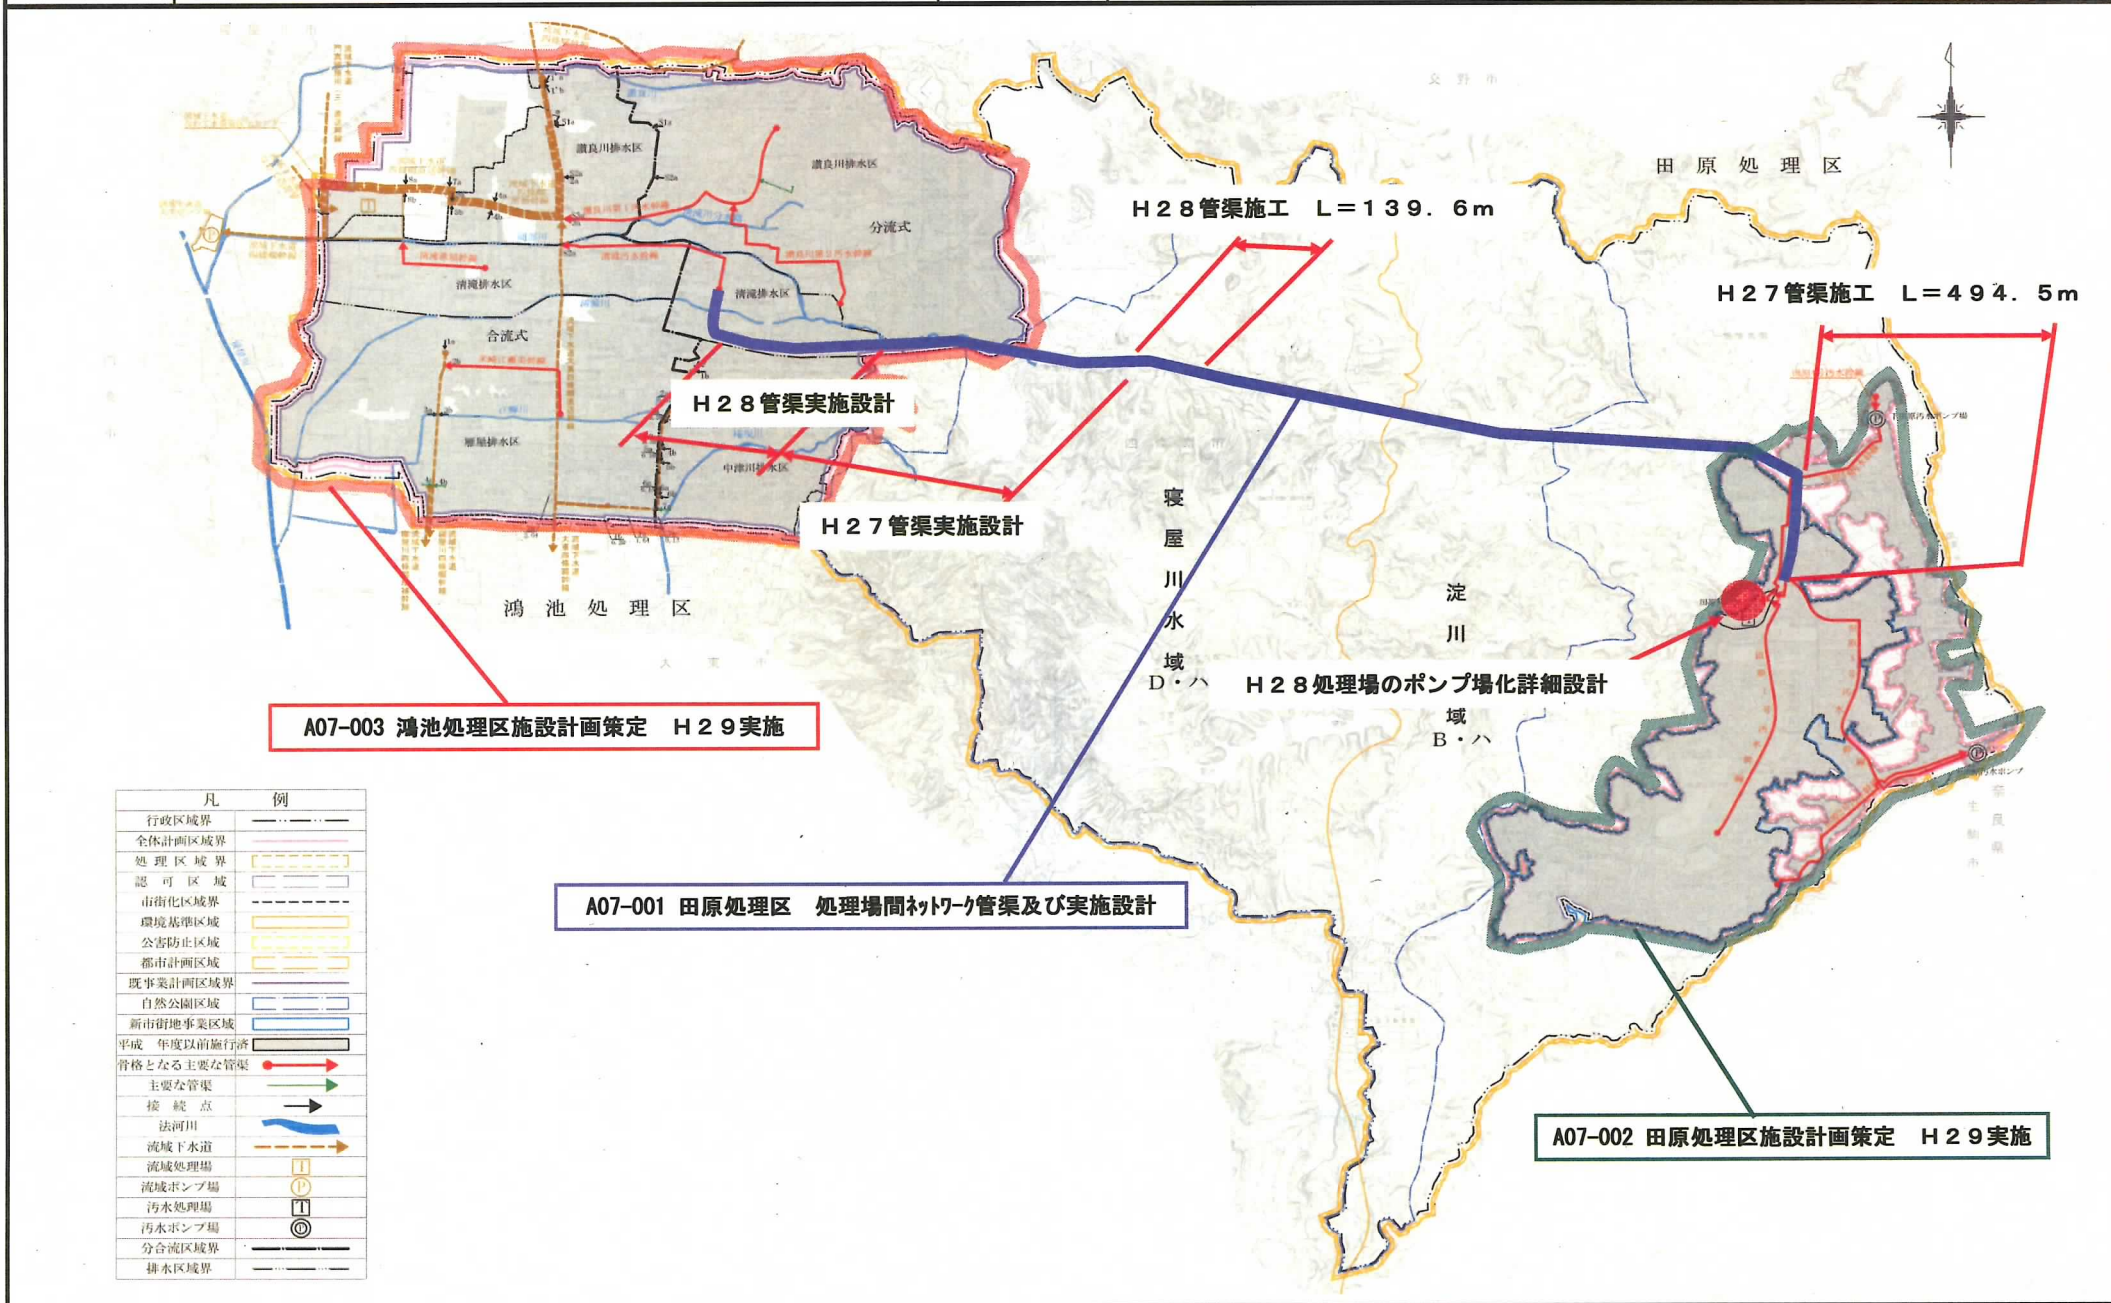

A07-003 鴻池処理区施設計画策定 H29実施

A07-001 田原処理区 処理場間ネットワーク管渠及び実施設計

A07-002 田原処理区施設計画策定 H29実施

凡	例
行政区境界	--- --
全体計画区域境界	— — — —
処理区域境界	— · — · — ·
認可区域	— · — · — ·
市街化区域境界	— · — · — ·
環境基準区域	— · — · — ·
公害防止区域	— · — · — ·
都市計画区域	— · — · — ·
既事業計画区域境界	— · — · — ·
自然公園区域	— · — · — ·
新市街地事業区域	— · — · — ·
平成 年度以前施行済	— · — · — ·
管格となる主要な管渠	→ (red)
主要な管渠	→ (green)
接続点	→ (black)
法河川	→ (blue)
流域下水道	→ (orange)
流域処理場	□ (grey)
流域ポンプ場	□ (grey) with circle
汚水処理場	□ (grey) with circle
汚水ポンプ場	□ (grey) with circle
分合流区域境界	— · — · — ·
排水区域境界	— · — · — ·
